

# Chantier de rénovation du Super U

11 mai 2017

## Entreprise Elec Issoire

<http://>

Chef de projet

Elève 1

Dates du projet

28 sept. 2017 - 17 oct. 2017

Avancée

2%

Tâches

17

Ressources

5

## Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Installation chemin de câble	28/09/17	13/10/17
Préparation du chantier <i>compléter la fiche activité 1 (réaliser un croquis, lister les tâches, recenser le matériel et consommables, organiser le recyclage, analyser les conditions de travail)</i>	28/09/17	29/09/17
Organisation du poste de travail <i>Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier. A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.</i>	02/10/17	03/10/17
Réalisation <i>Réaliser le travail demandé en respectant les consignes. Implantation des fixations du chemin de câble. Pose du chemin de câble. Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT et raccordement sur le départ prévu.</i>	04/10/17	12/10/17
Nettoyage du chantier <i>Nettoyer le chantier. Ranger l'outillage. Recycler les déchets.</i>	13/10/17	13/10/17
Installation canalis départ boulangerie	28/09/17	13/10/17
Préparation du chantier <i>compléter la fiche activité 1 (réaliser un croquis, lister les tâches, recenser le matériel et consommables, organiser le recyclage, analyser les conditions de travail)</i>	28/09/17	29/09/17
Organisation du poste de travail <i>Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier. A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.</i>	02/10/17	03/10/17
Réalisation <i>Réaliser le travail demandé en respectant les consignes. Implantation des fixations du canalis. Pose du canalis. Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT et raccordement sur le départ prévu.</i>	04/10/17	12/10/17
Nettoyage du chantier <i>Nettoyer le chantier. Ranger l'outillage. Recycler les déchets.</i>	13/10/17	13/10/17
Installation batterie de condensateurs	28/09/17	12/10/17
Préparation du chantier <i>compléter la fiche activité 1 (Repérer et surligner sur les schémas et plans modifiés le travail à réaliser, organiser le recyclage, analyser les conditions de travail).</i>	28/09/17	28/09/17

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Organisation du poste de travail <i>Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier. A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail. Réaliser la consignation de l'installation.</i>	29/09/17	02/10/17
Réalisation <i>Réaliser le travail demandé en respectant les consignes. Implantation le matériel dans l'armoire électrique. Raccordements et repérages du matériel.</i>	03/10/17	11/10/17
Nettoyage du chantier <i>Nettoyer le chantier. Ranger l'outillage. Recycler les déchets.</i>	12/10/17	12/10/17
Livraison <i>Réaliser la mise en service de l'installation complète. Vérifier les protections, la continuité des terres et des masses, le contrôle d'isolement. Déconsigner l'installation et réaliser les mesures et essais de mise en service. (mesure de tensions, contrôle ordre des phases)</i>	16/10/17	16/10/17
réception du chantier <i>Remettre au client les dossiers mis à jour. Expliquer au client le fonctionnement et les caractéristiques électriques de la nouvelle installation à partir du cahier des charges.</i>	16/10/17	16/10/17

Ressources

Nom	Habilitation
Elève 1	B2V, BC
Elève 2	B1V
Elève 3	B1V
Elève 4	B1V
Elève 5	B1V

Diagramme de Gantt

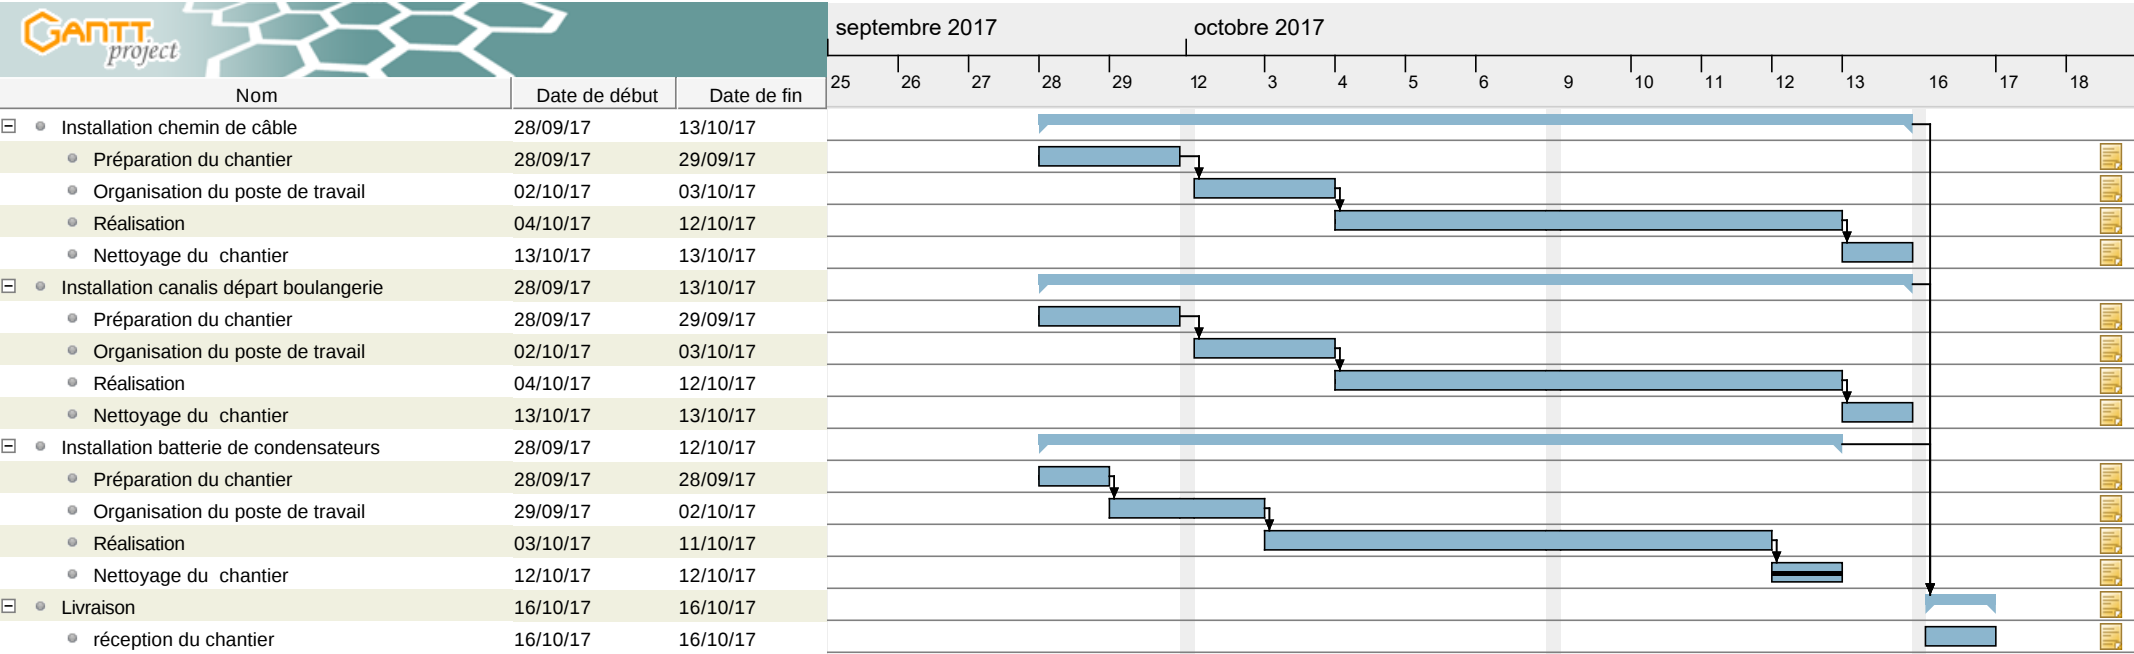


Diagramme des Ressources

