

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Menuiserie aluminium-Verre

Session 2026

Durée : 12 h

Coefficient : 3

EPREUVE E3

Sous-épreuve E32 (U32)

Fabrication d'un ouvrage

Ce dossier comporte **3** pages, numérotées de **DS 1 / 3** à **DS 3 / 3**.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Mise en situation

Vous devez réaliser la fabrication du châssis composé ci-contre :

Ensemble composé de :


- 1 châssis oscillo-battant 1 vantail,
- 1 tube de liaison de 40 mm ou autre,
- 1 imposte fixe trapézoïdale avec montant central.

On vous demande :

- De contrôler vos fournitures (état et quantités).
- De réaliser le débit, l'usinage et l'assemblage des éléments.
- De mettre en place le vitrage (uniquement pour l'OB).

Chaque centre adapte l'ouvrage à sa gamme de profils

VUE EN ÉLEVATION DE L'ENSEMBLE COMPOSÉ
(VUE INTÉRIEURE)

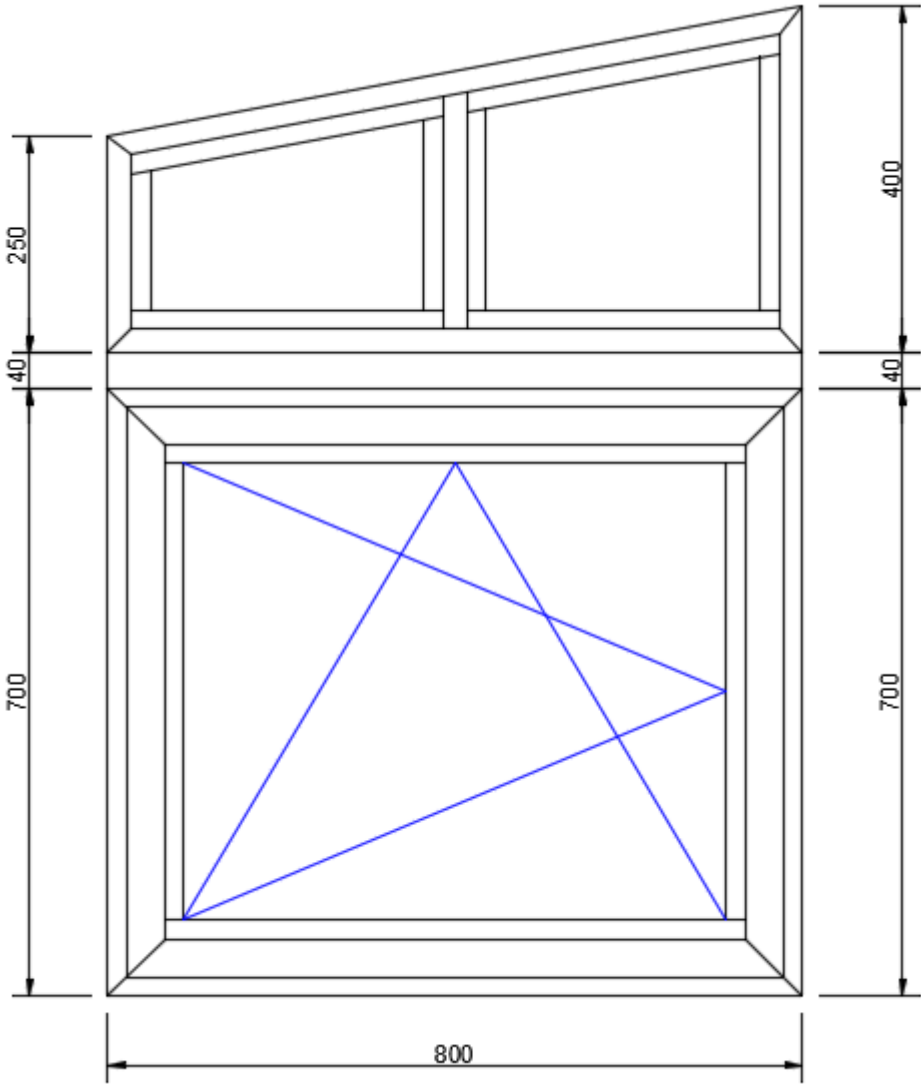

Session 2026		N° candidat :
EXAMEN : Baccalauréat professionnel : Menuiserie aluminium-Verre		
Sous-épreuve : E 32 Fabrication d'un ouvrage		
Durée : 12 h	Coefficient : 3	Page : 3/3

FICHE D'ÉVALUATION
(à remettre aux correcteurs en début d'épreuve)

DESCRIPTIF DES TÂCHES	Barème
Les coupes des profilés sont conformes à la fiche de débit (tolérance + / - 1)	/ 10
L'usinage des différents profilés respecte les plans gammiste	/ 10
L'assemblage du dormant de l'imposte fixe est conforme (jonction, affleurement, étanchéité)	/ 5
L'assemblage du dormant de l'OB est conforme (jonction, affleurement, étanchéité)	/5
L'assemblage du fixe et du cadre de l'OB est conforme (jonction, affleurement, étanchéité)	/5
L'assemblage de l'ouvrant est conforme (jonction, affleurement, étanchéité)	/ 5
Les parclores sont parfaitement ajustées	/ 5
Tous les accessoires sont mis en place et respectent les préconisations du gammiste	/ 10
Tous les joints sont mis en place et assurent leur fonction (intérieur et extérieur)	/ 5
Le calage est correctement mis en place et respecte le DTU	/ 5
Le réglage de l'ouvrant est réalisé et permet un bon fonctionnement (ouverture/fermeture)	/ 10
L'état de surface des profilés n'est pas altéré	/ 5
Le travail est effectué en respectant les règles de sécurité	/10
Le poste de travail est rangé et nettoyé	/ 10
Total	/ 100

Date :

Correcteurs :

Centre d'examen :

Signatures :
