AFPBTP DES LANDES

CONSTRUCTION D'UN INTERNAT AU CFA DE MORCENX

PLANNING PREVISIONNEL
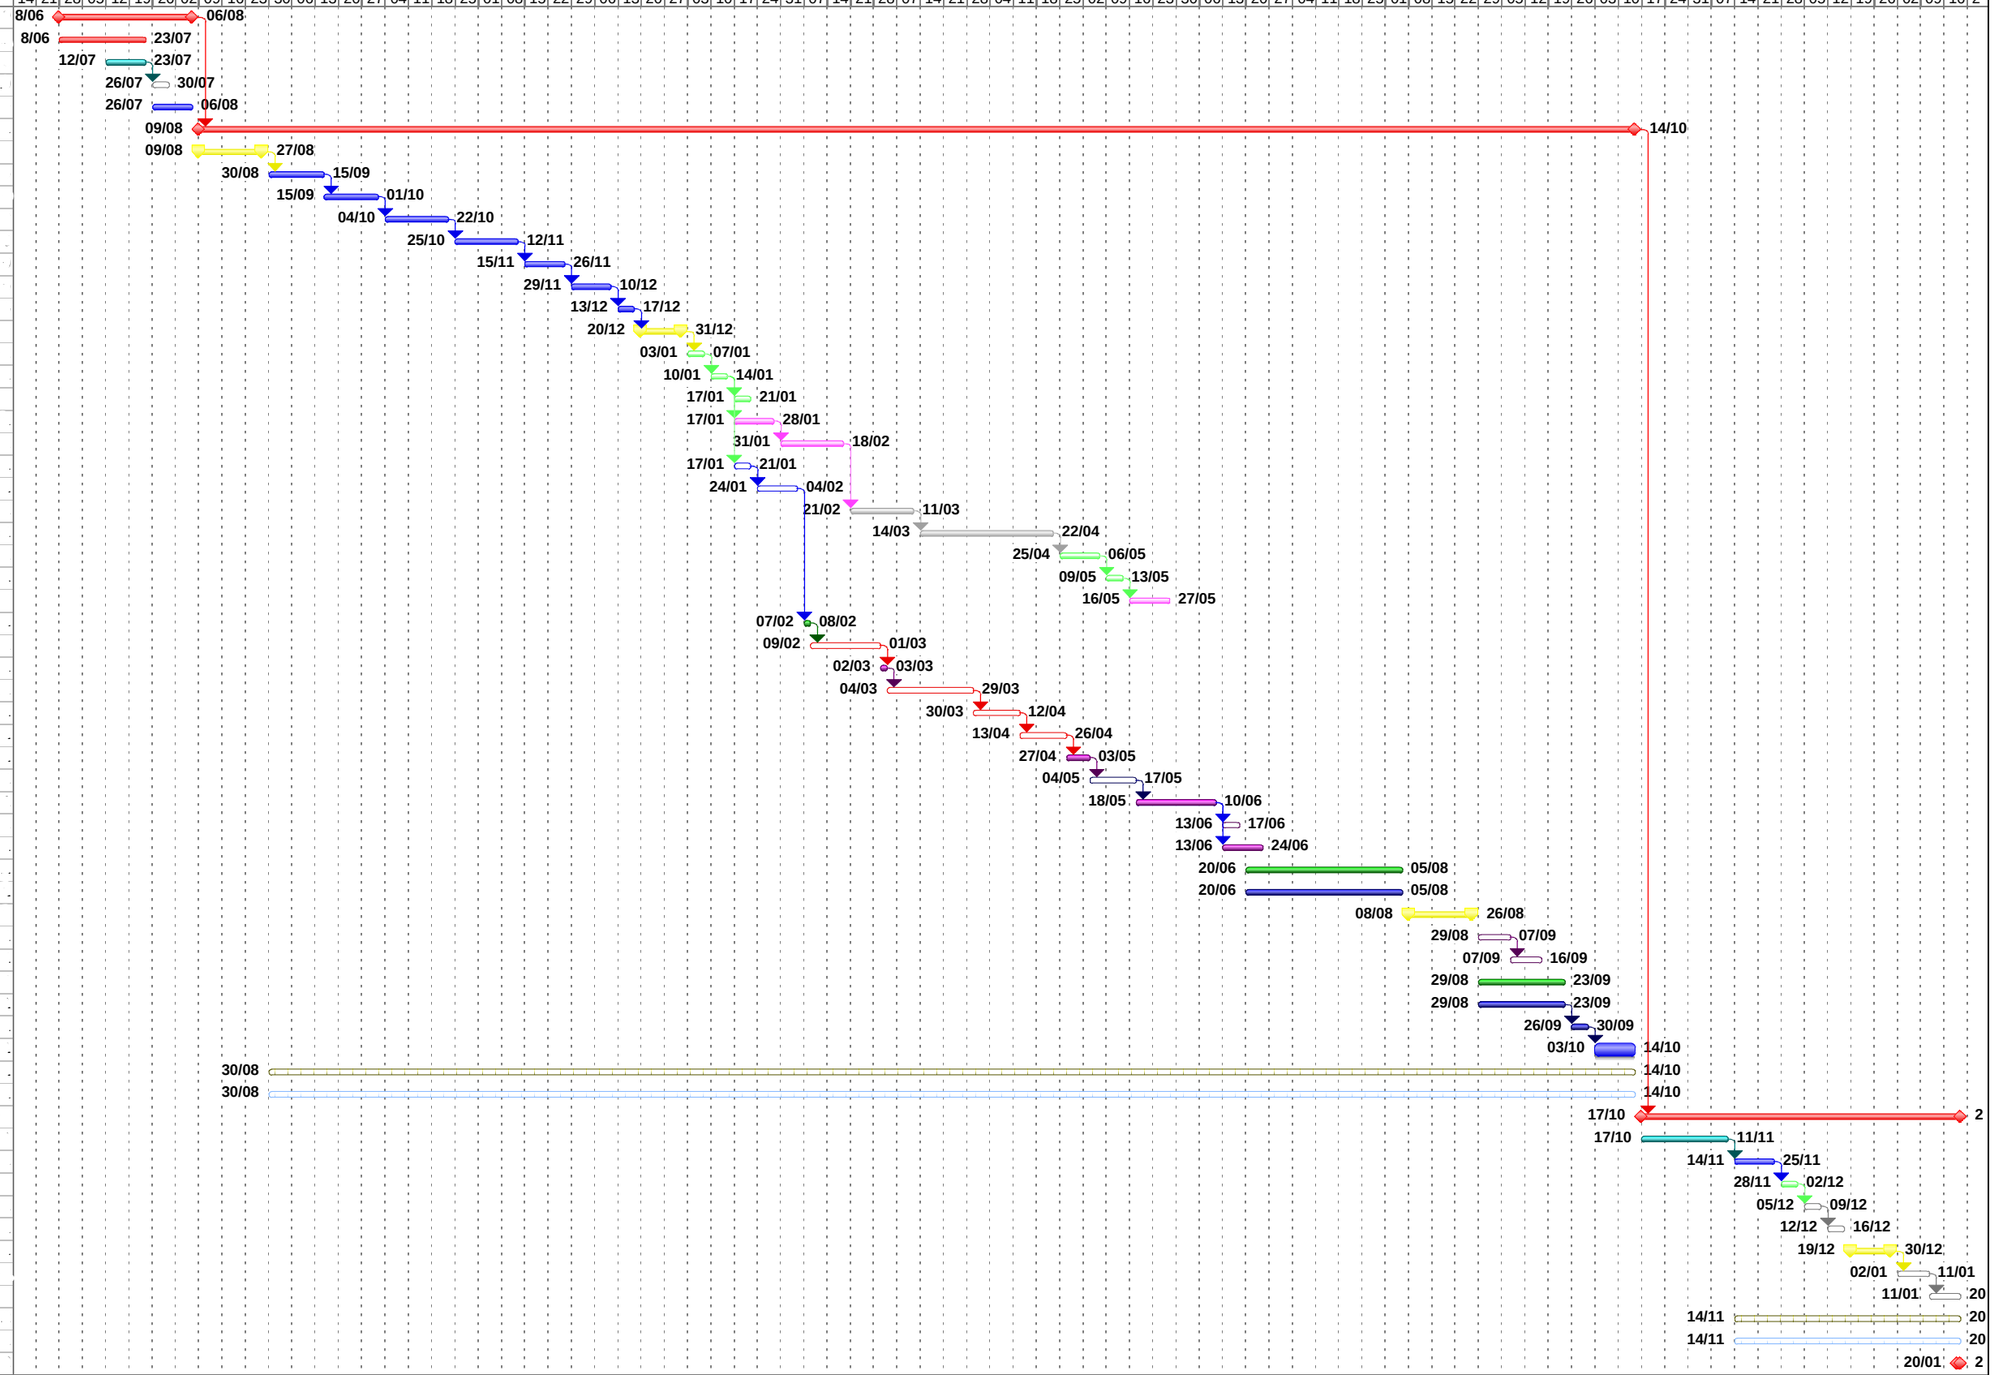
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	Phase 1	Lun 28/06	Ven 06/08
2	Préparation	Lun 28/06	Ven 23/07
3	Démolition Zone 1	Lun 12/07	Ven 23/07
4	Terrassement Forme	Lun 26/07	Ven 30/07
5	Installation de chantier	Lun 26/07	Ven 06/08
6	Phase 2	Lun 09/08	Ven 14/10
7	Congés	Lun 09/08	Ven 27/08
8	Fondation	Lun 30/08	Mer 15/09
9	Dallage	Mer 15/09	Ven 01/10
10	Rez de chaussée	Lun 04/10	Ven 22/10
11	Plancher Haut rdc	Lun 25/10	Ven 12/11
12	Etage	Lun 15/11	Ven 26/11
13	Plancher haut étage	Lun 29/11	Ven 10/12
14	Acrotères	Lun 13/12	Ven 17/12
15	Congés	Lun 20/12	Ven 31/12
16	Pré scellement charpente métal	Lun 03/01	Ven 07/01
17	Charpente couverture Comble	Lun 10/01	Ven 14/01
18	Préscellement sur façade	Lun 17/01	Ven 21/01
19	Etanchéité plancher haut 1	Lun 17/01	Ven 28/01
20	Etanchéité plancher haut rdc	Lun 31/01	Ven 18/02
21	Menuiserie extérieure 1er	Lun 17/01	Ven 21/01
22	Menuiserie ext rdc	Lun 24/01	Ven 04/02
23	Isolation façades + enduits	Lun 21/02	Ven 11/03
24	Isolation façades + panneaux	Lun 14/03	Ven 22/04
25	Brise soleil	Lun 25/04	Ven 06/05
26	Auvent	Lun 09/05	Ven 13/05
27	Substrat végétalisation	Lun 16/05	Ven 27/05
28	Huisseries portes	Lun 07/02	Mar 08/02
29	Cloison plâtre étage	Mer 09/02	Mar 01/03
30	Ensemble menuisé intérieur	Mer 02/03	Jeu 03/03
31	Cloison plâtre rdc	Ven 04/03	Mar 29/03
32	Plafond plâtre étage	Mer 30/03	Mar 12/04
33	Plafond platre	Mer 13/04	Mar 26/04
34	Chape	Mer 27/04	Mar 03/05
35	Faux plafonds	Mer 04/05	Mar 17/05
36	Faïences	Mer 18/05	Ven 10/06
37	Ragréage	Lun 13/06	Ven 17/06
38	Carrelages	Lun 13/06	Ven 24/06
39	Menuiserie intérieure	Lun 20/06	Ven 05/08
40	Peinture intérieure	Lun 20/06	Ven 05/08
41	Congé	Lun 08/08	Ven 26/08
42	Sols souples étage	Lun 29/08	Mer 07/09
43	Sols souples rdc	Mer 07/09	Ven 16/09
44	Finition menuiserie intérieure	Lun 29/08	Ven 23/09
45	Finition peinture	Lun 29/08	Ven 23/09
46	Nettoyage	Lun 26/09	Ven 30/09
47	Levée des réserve	Lun 03/10	Ven 14/10
48	Electricité	Lun 30/08	Ven 14/10
49	Plomberie sanitaire	Lun 30/08	Ven 14/10
50	Phase 3	Lun 17/10	Ven 20/01
51	Démolition zone 2	Lun 17/10	Ven 11/11
52	Dallages extérieurs	Lun 14/11	Ven 25/11
53	Fin auvent	Lun 28/11	Ven 02/12
54	Minéralisation patio	Lun 05/12	Ven 09/12
55	Voiries	Lun 12/12	Ven 16/12
56	Congés	Lun 19/12	Ven 30/12
57	Doublement parking	Lun 02/01	Mer 11/01
58	Espaces vert	Mer 11/01	Ven 20/01
59	Electricité	Lun 14/11	Ven 20/01
60	Plomberie sanitaire	Lun 14/11	Ven 20/01
61	Réception	Ven 20/01	Ven 20/01
